


## Memo

Onderwerp **Beschrijving werkzaamheden Landtong Rozenburg**

Op de uit te geven terreinen van de Landtong gaan verschillende werkzaamheden plaats vinden. Het meest oostelijke kavel wordt uitgegeven aan een bedrijf dat actief is in de transport- en logistieke sector waarbij er distriloodsen op het kavel geplaatst. Het terrein wordt geëgaliseerd, waarbij de aanwezige vegetatie wordt verwijderd en er worden inrit aangelegd. Het uit te geven terrein zal een peilhoogte hebben van 5,67m NAP. Tevens wordt de huidige afrit naar het EIC verlegd. Het verwijderen van de vegetatie gebeurt in twee stappen, eerst wordt de vegetatie bovengronds gekapt. Na het stormseizoen worden de ondergrondse wortels e.d. verwijderd.

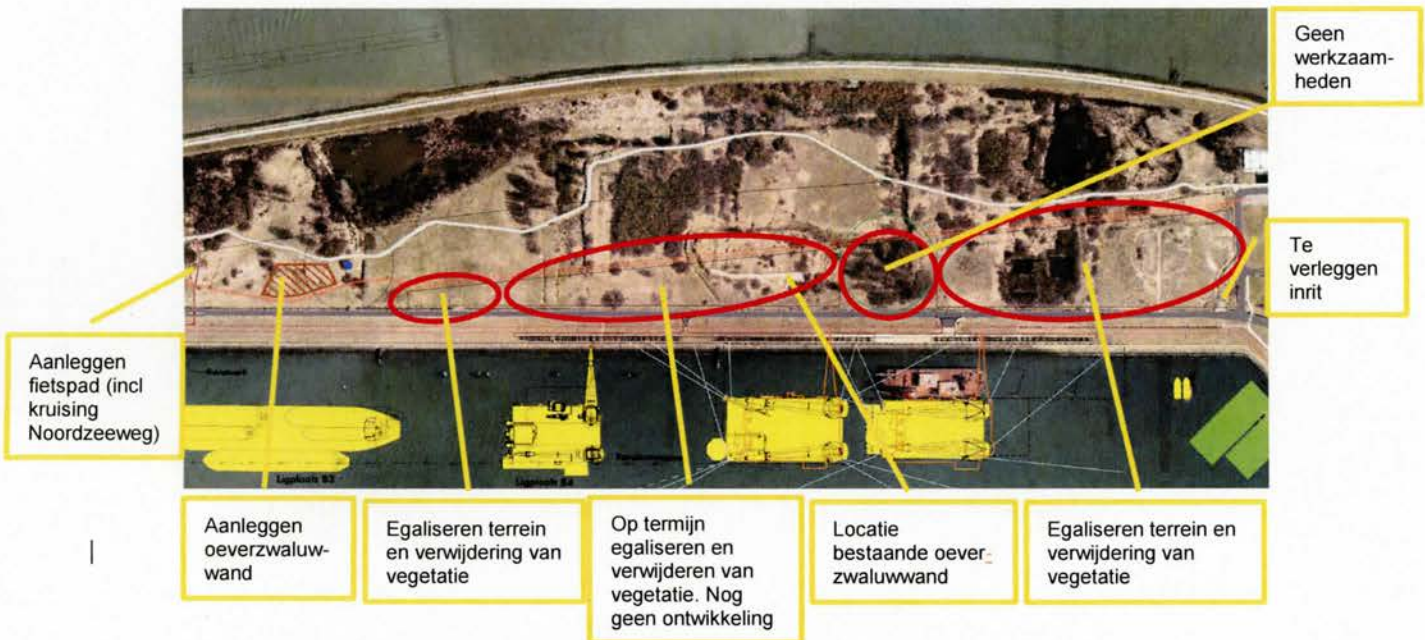

Figuur 1: overzicht activiteiten uit te geven terrein Landtong Rozenburg.

Als het terrein is geëgaliseerd wordt het terrein verder door de toekomstige gebruiker ingericht.

De huidige oeverwaluwand bevindt zich op nog uit te geven terrein, waarvoor op dit moment nog geen gegadigde is. De wand verplaatst om in de toekomst hier wel een klant te kunnen vestigen. Eerst wordt een nieuwe oeverwaluwand aangelegd waarna de bestaande oeverwaluwand wordt afgebroken, dit vindt op z'n vroegst plaats na het broedseizoen van 2019. Egalisatie en verwijderen vegetatie vindt plaats gelijktijdig / na verwijderen wand.

Het meest westelijk gelegen uit te geven kavel gaat worden gebruikt voor het opslaan van 'batterijen' om de walstroom van Heerema te kunnen faciliteren. Hiertoe wordt ook dit terrein geëgaliseerd en wordt de aanwezige vegetatie verwijderd, wederom in twee stappen.
